Сравнение редакций тома 4.1.2 «Архитектурные решения» 1439/2025/4-ИЛО1.2

Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле). Раздел 4, подраздел 1, часть 2.

	Редакция от 29.07.2026	**Редакция от 16.10.2026**
Файл	Раздел ПД №4 Подраздел №1 Часть №2 ИЛО1.2 (Парк_АР) (1439_2025_4) 26.07.29.pdf	Раздел ПД №4 Подраздел №1 Часть №2 ИЛО1.2 (Парк_АР) (1439_2025_4) 26.10.16.pdf
Количество страниц	41	101

Рассмотрены текстовая и графическая части тома в двух редакциях. Ниже приведены все внесённые изменения, для графической части — с фрагментами листов. Технические паспорта на блок-модули, включённые в редакцию от 16.10.2026, приведены справочно, их содержание в настоящем сравнении не рассматривалось.

1. Состав тома

Часть тома	**Редакция от 29.07.2026**	**Редакция от 16.10.2026**
Титульные листы, содержание тома 1439/2025/4-ИЛО1.2-С	стр. 1–4	стр. 1–4
Текстовая часть 1439/2025/4-ИЛО1.2-ТЧ	стр. 5–27 (23 листа)	стр. 5–27 (23 листа)
Графическая часть 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.01 … 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.14	стр. 28–41	стр. 28–41
Технический паспорт «Здание мобильное (инвентарное) контейнерного типа «БЫТОВОЙ МОДУЛЬ»», состояние на апрель 2026 г.	—	стр. 42–61 (20 стр.)
Технический паспорт «… контейнерного типа «КЛАДОВАЯ»», состояние на апрель 2026 г.	—	стр. 62–79 (18 стр.)
Технический паспорт «… контейнерного типа Туалетный модуль (с чашей генуя)», состояние на июль 2024 г.	—	стр. 80–101 (22 стр.)

2. Текстовая часть 1439/2025/4-ИЛО1.2-ТЧ

В остальном текст не изменился, за исключением нумерации разделов и страниц.

Раздел	Редакция от 29.07.2026	Редакция от 16.10.2026
Титульный лист, стр. 2	«Главный инженер» Мезенцев Д.В.	«Главный инженер проекта» Мезенцев Д.В.
Содержание текстовой части, стр. 5–6	Разделы 1–17	Разделы 1–16; добавлены подразделы 5.1–5.4; раздел «11. Результаты расчетов продолжительности инсоляции и коэффициента естественной освещенности» исключён, разделы 12–17 перенумерованы в 11–16
3.2 Туалетный модуль	«Теплая кабина изготавливается в автономном варианте с унитазом со сквозным отверстием в полу кабины. Габаритные размеры здания – 1,7x1,4x2,69 (h) м.»	«Теплая кабина изготавливается в автономном варианте с чашей Генуя, с подключением к наружным сетям водоснабжения и водоотведения Габаритные размеры здания – 2 000×1 500×2 650.»
3.4 Бытовой модуль	«…габаритные размеры 18,0x9,0x2,8 (h) м…»	«…габаритные размеры 18,0x9,0x4,29 (h) м…»
3.7 Здание МК АТС	«Габаритные размеры модуля 6,6×21,9×2,69 (h) м.»	«Габаритные размеры модуля 6,3×23,1×2,75 (h) м.»
5 Энергетическая эффективность	Один абзац: «Наружные стены и покрытие всех зданий выполнены из сэндвич-панелей с использованием эффективного утеплителя… Окна из ПВХ профилей с однокамерными или двухкамерными стеклопакетами… Все наружные двери выполнены утепленными.»	Подразделы 5.1 Туалетный модуль, 5.2 Модульный пункт обогрева, 5.3 Бытовой модуль, 5.4 Кладовая: стены — трёхслойная сэндвич-панель, базальтовая вата 120 мм, 100–110 кг/м3, облицовка 0,7 мм; таблицы сопротивления теплопередаче (туалетный модуль: крыша 4,20, стена 3,19, пол 4,36; пункт обогрева: 4,15 / 4,11 / 4,36; бытовой модуль и кладовая: 3,79 / 3,79 / 4,29 м2·°C/Вт); входные двери по ГОСТ 31173-2016
8 Композиционные приёмы (фасады)	—	Добавлено: «Комбинация указанных цветов RAL по схеме окраски зданий в соответствии с требованиями Руководства по применению фирменного стиля ОАО «РЖД», прил. 14 Правила цветового оформления объектов инфраструктуры, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» 15.12.2011 №2724р.»


9 Отделка помещений	«Обшивка потолка «Туалетного модуля» выполнена панелью металлической 0,5 мм.» «Стены… базальтовым волокном толщиной 80 мм… Обшивка внутренних стен выполнена из алюминиевого листа рифленого… толщиной 1,5 мм.»	«Потолок «Туалетного модуля» изготовлен из стеновых трехслойных панелей… базальтовым волокном толщиной 120 мм…» «Стены… толщиной 120 мм… Обшивка стен выполнена из стали оцинкованной толщиной 0,5 мм.» Добавлено: отделка путей эвакуации из материалов НГ; линолеум Tarkett ACCZENT PRO или аналог, КМ2; кабели с индексом LS
10 Естественное освещение	«…окна из ПВХ-профиля с двухкамерным стеклопакетом… окно из ПВХ профиля с однокамерным стеклопакетом.»	Добавлено «по ГОСТ 30674—2023»; система Grain-Prestige 70 мм или аналог; размеры окон: 600×600 мм (туалетный модуль), 1200×1250 (модульный пункт обогрева), 1200×1200 (бытовой модуль); стеклопакет СПО (32 мм); для пункта обогрева — рольставни Alutech Trend PD55mN или аналог с электроприводом AM1/10-15
15 (было 16) Обоснование номенклатуры помещений	«Не разрабатывается.»	Полный текст: санитарно-бытовые помещения по СП 44.13330.2011; гардеробные, душевые, уборные при гардеробных, шкафы для сушки спецодежды в бытовом модуле; кладовые для спецодежды не предусмотрены; выдача спецодежды на складе Логистического комплекса; «Место для хранения уборочного инвентаря предусмотрено в помещении санузла, пом. №2.»

3. Графическая часть 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ

Лист	Изменения в редакции от 16.10.2026
1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.01 (стр. 28) Ведомость документов графической части	Без изменений
1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.02 (стр. 29) Туалетный модуль. План, разрез 1-1	План: 1400×1700 → 1500×2000 мм. Разрез: высота 2690 → 2650 мм; добавлены отметки 0,000, +2,650, «+2,240 высота потолка»; состав стены, кровли и пола заменён (сэндвич-панель 120 мм, плита XPS 50 мм, минвата 150 мм, фанера 18 мм); надпись «Отмостку см. ПЗУ» и изображение отмостки на разрезе удалены. Экспликация: туалетная кабина 1,91 → 2,47 м². Основные показатели: площадь застройки 2,38 → 3,0 м², общая площадь 1,91 → 2,47 м², строительный объём 6,4 → 7,95 м³. Примечания 1–5 без изменений
1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.03 (стр. 30) Туалетный модуль. Фасады	Ширина 1400 → 1500 мм (фасады 1-2, 2-1) и 1700 → 2000 мм (А-Б, Б-А); верх «+2,690» → «+2,650». Фасад Б-А: добавлены отметки +1,950 и +1,350 (окно); отметка «134,81» под 0,000 удалена. Фасад 1-2: изменена сторона открывания двери. Полоса RAL 3020 показана ниже (высота полосы не проставлена ни в одной редакции)

1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.04 (стр. 31) Модульная компрессорная. План, разрез 1-1	Добавлены отметка «+2,970*» и сноска «* - уточнить по месту». Разрез 1-1 перенесён на листе без изменений. План, спецификация, экспликация, показатели, примечания — без изменений
1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.05 (стр. 32) Модульная компрессорная. Фасады	Добавлены отметки: «+2,300» (фасады 1-2 и А-Б), «+1,645» и «+1,230» (фасад 2-1). Остальное без изменений
1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.06 (стр. 33) Модульный пункт обогрева. План, разрез 1-1	«Окно 1000х1000мм» → «Окно 1200х1250мм»; на плане размеры по проёму 720 / 1000 / 720 → 620 / 1200 / 620 (оба модуля). Разрез: добавлена «+2,460 высота потолка». Экспликация, показатели, примечания без изменений
1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.07 (стр. 34) Модульный пункт обогрева. Фасады	Фасад В-А: отметки +2,890; +2,300; +1,900; +0,900 → +2,890; +2,150; +0,900. Фасад А-В: добавлена «+2,050». На всех четырёх фасадах удалена «−0,300 Ур.з.»
1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.08 (стр. 35) БКТП 250 кВА. Фасады	На всех четырёх фасадах удалены «−0,400 Ур.з.» и изображение рельефа и опор под зданием. Добавлены отметки: А-Г +2,480, +0,270; Г-А +2,540, +0,270; 1-2 и 2-1 +2,540, +1,730, +1,360, +0,550. Примечание 2 «… соответствует абсолютной отметке 149,51.» заменено на «За условные отметки 0.000 приняты отметки чистого пола, которые соответствуют абсолютным отметкам 149,51 в районе четной горловины проектируемого Парка и 150,21 в районе нечетной горловины проектируемого Парка.»
1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.09 (стр. 36) Бытовой модуль. План, разрез 1-1	План: мебель и оборудование на плане больше не показаны; изменены перегородки и двери у оси Б в осях 5–7. Экспликация: было 16 позиций, стало 17 (см. таблицу ниже). Показатели: площадь застройки 162,0 м² и общая площадь 145,48 м² — без изменений; строительный объём 453,6 → 694,98 м³. Разрез: плоская кровля с верхом +2,800 заменена двускатной с верхом +4,290; добавлена «+2,500 высота потолка»; удалена «−0,300 Ур. земли»
1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.10 (стр. 37) Бытовой модуль. Фасады	Двускатная кровля: конёк +4,290, карниз +2,890 (было +2,800); показана разрезка на модули. Фасад 1-7: было 3 окна и 1 дверь, стало 1 окно и 1 дверь. Фасады А-Б, Б-А, 7-1: число проёмов не изменилось. Добавлены отметки +2,100 и +0,900 (окна), +2,050 (двери); удалена «−0,300 Ур. з.»
1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.11 (стр. 38) Кладовая. План, разрез 1-1	Добавлена «+2,700 высота потолка». Остальное без изменений
1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.12 (стр. 39) Кладовая. Фасады	Добавлена «+2,050» на фасаде 1-2. Остальное без изменений
1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.13 (стр. 40) Модуль АСДТ-5. Фасады	На всех четырёх фасадах удалены «−0,300 Ур. з.» и изображение опор; на фасаде А-Б добавлена «+2,050»

1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.14 (стр. 41) Здание МК АТС. Фасады	Торцевые фасады: 6600 → 6300 мм. Продольные фасады: 21900 → 9000 + 3100 + 11000 = 23100 мм, добавлены оси 2 и 3; дверь на фасаде 4-1 показана у оси 3. Удалены «−0,300 Ур. з.» и «−0,200», добавлена «0,000»; верх «+2,690» → «+2,700» и «+2,750»; на фасаде 4-1 добавлена «+2,050». Название «Фасад в осях Б-А» заменено на «Фасад в осях А-Б»

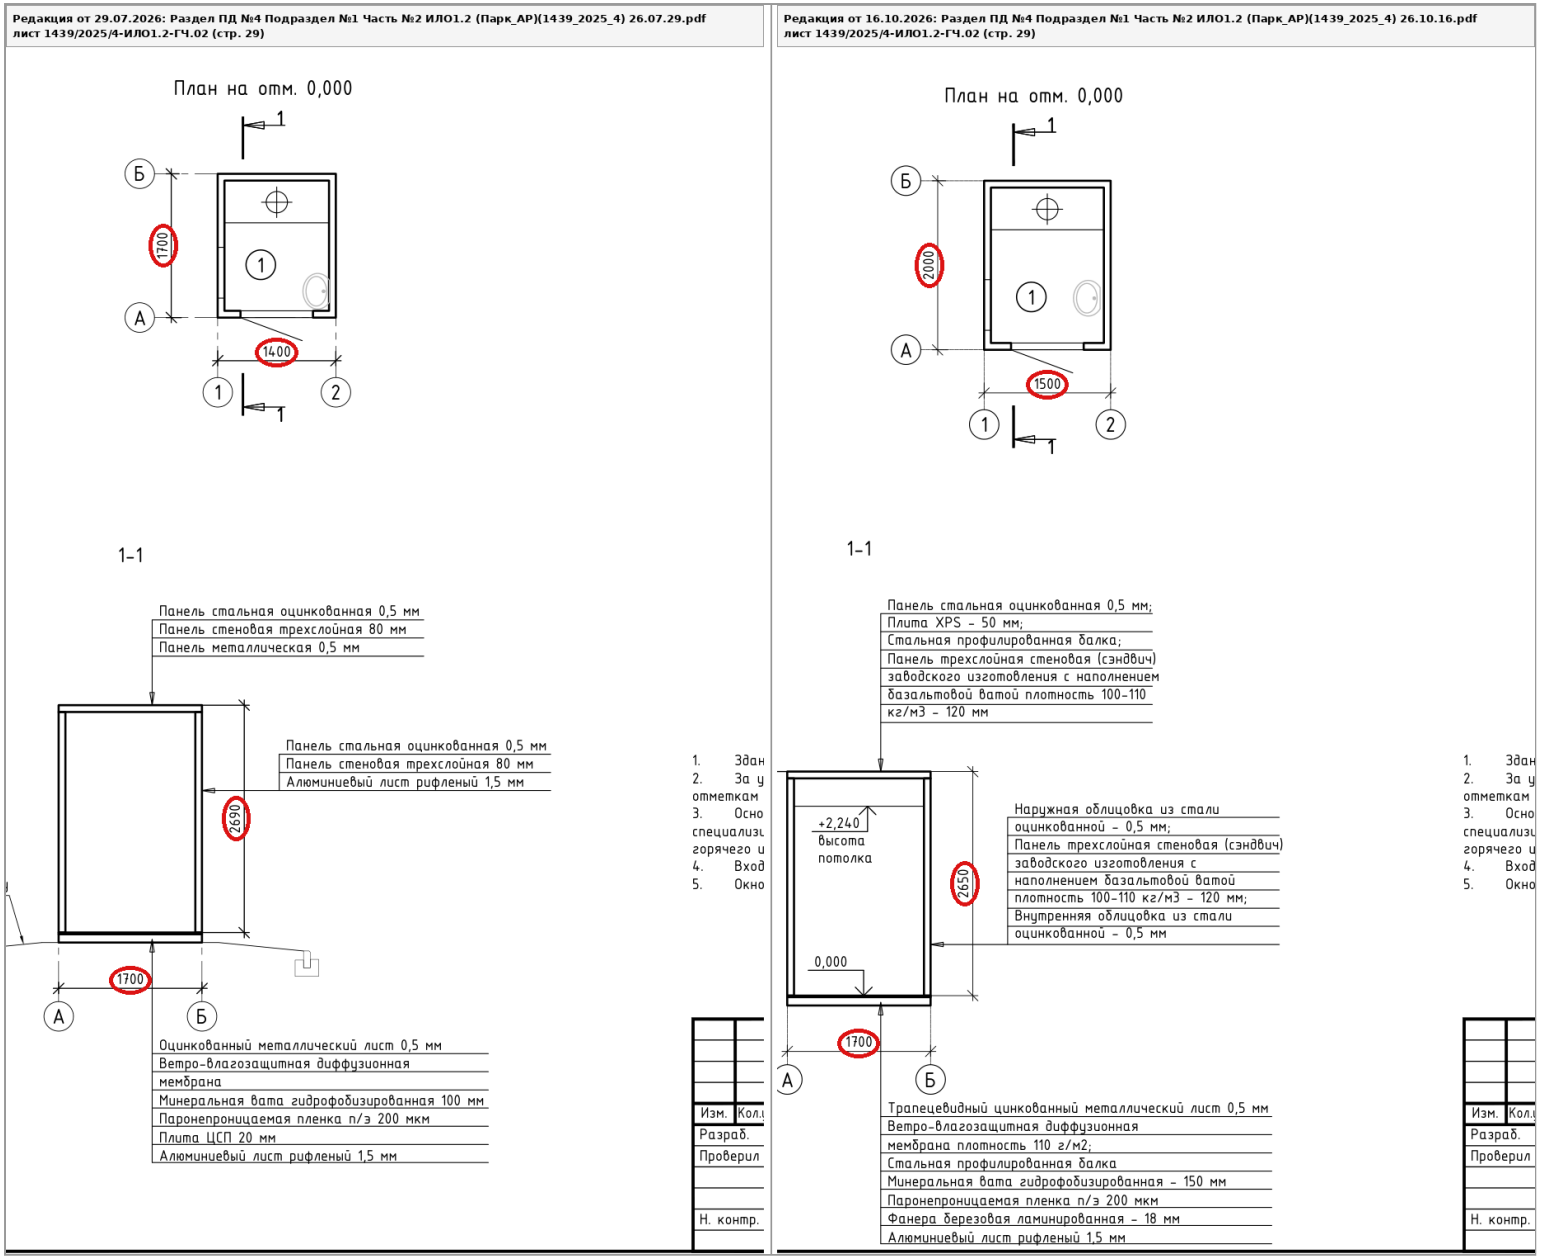

Лист 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.02. Туалетный модуль: план и разрез 1-1 (в редакции от 16.10.2026 на разрезе размер А–Б 1700, на плане 2000)

Редакция от 29.07.2026:
Раздел ПД №4 Подраздел №1 Часть №2 ИЛО1.2 (Парк_АР)(1439_2025_4) 26.07.29.pdf
лист 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.02 (стр. 29)

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
1	Туалетная кабина	1,91	

Основные строительные показатели

Наименование	Ед. измерения	Кол-во
Площадь застройки	м²	2,38
Общая площадь	м²	1,91
Строительный объем	м³	6,4
в т.ч.подземный	м³	-

Редакция от 16.10.2026:
Раздел ПД №4 Подраздел №1 Часть №2 ИЛО1.2 (Парк_АР)(1439_2025_4) 26.10.16.pdf
лист 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.02 (стр. 29)

Экспликация помещений


Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
1	Туалетная кабина	2,47	

Основные строительные показатели


Наименование	Ед. измерения	Кол-во
Площадь застройки	м²	3,0
Общая площадь	м²	2,47
Строительный объем	м³	7,95
в т.ч.подземный	м³	-

Лист 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.02. Туалетный модуль: экспликация и основные строительные показатели

Редакция от 29.07.2026: Раздел ПД №4 Подраздел №1 Часть №2 ИЛО1.2 (Парк_АР)(1439_2025_4) 26.07.29.pdf
лист 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.03 (стр. 30)

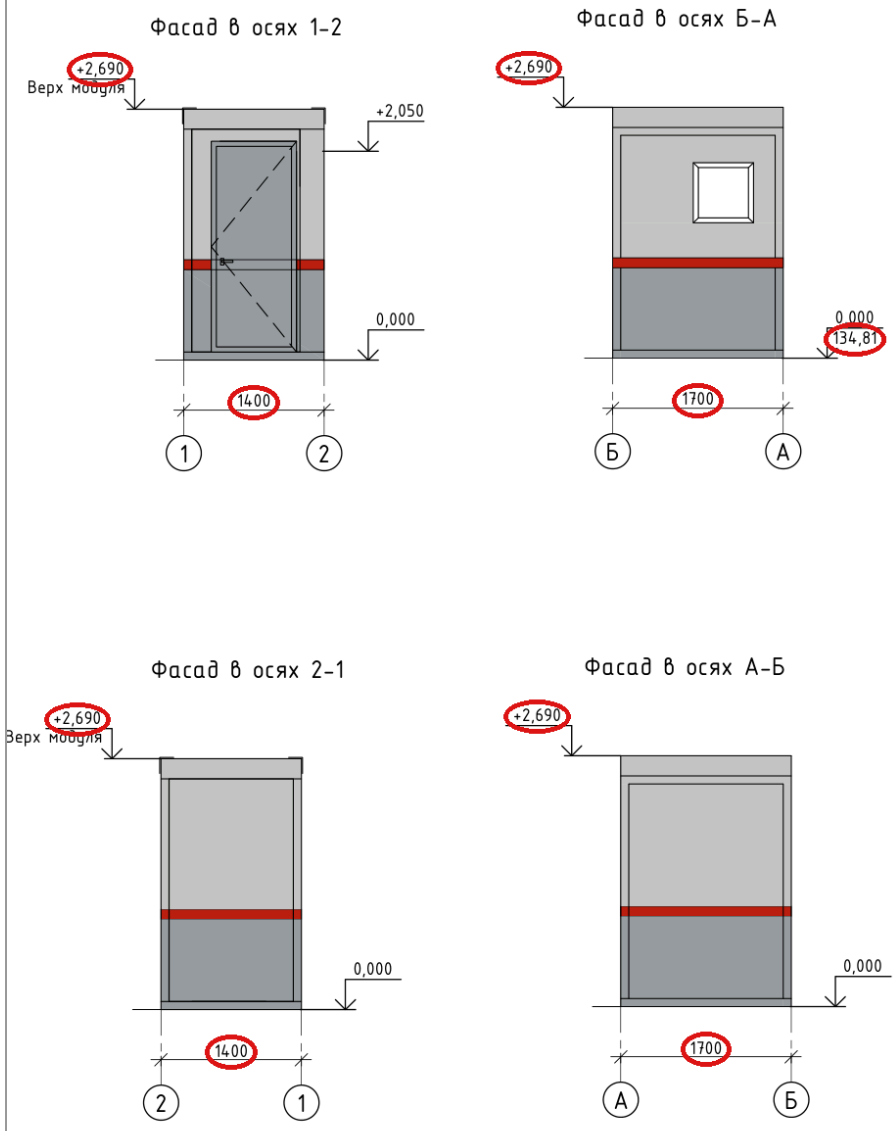


Редакция от 16.10.2026: Раздел ПД №4 Подраздел №1 Часть №2 ИЛО1.2 (Парк_АР)(1439_2025_4) 26.10.16.pdf
лист 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.03 (стр. 30)

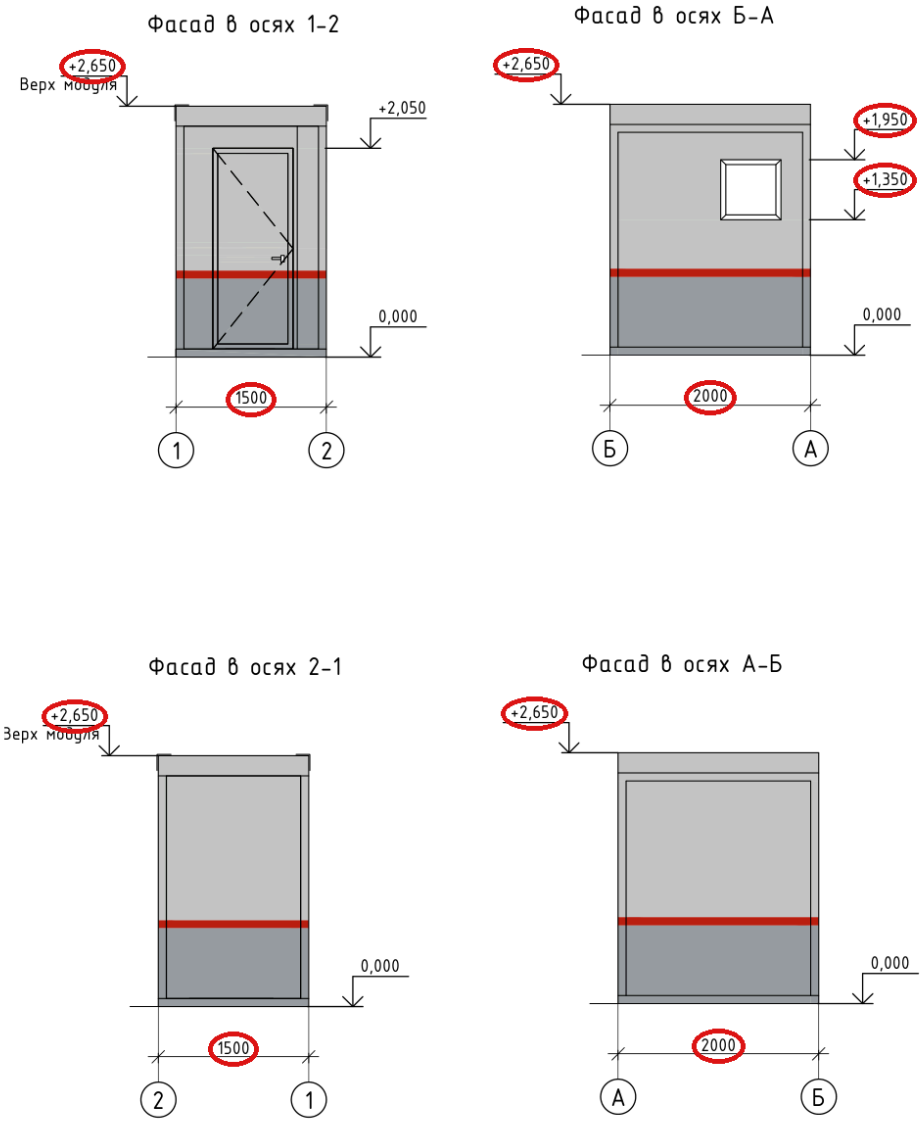


Лист 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.03. Туалетный модуль: фасады

Редакция от 29.07.2026: Раздел ПД №4 Подраздел №1 Часть №2 ИЛО1.2 (Парк_АР)(1439_2025_4) 26.07.29.pdf
лист 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.04 (стр. 31)

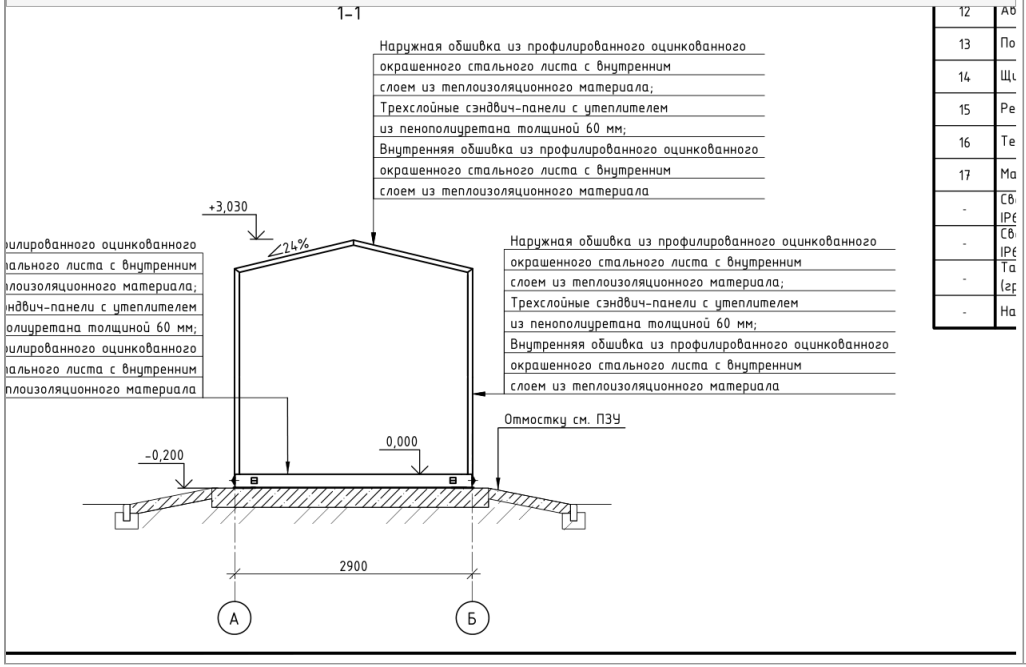


Редакция от 16.10.2026: Раздел ПД №4 Подраздел №1 Часть №2 ИЛО1.2 (Парк_АР)(1439_2025_4) 26.10.16.pdf
лист 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.04 (стр. 31)

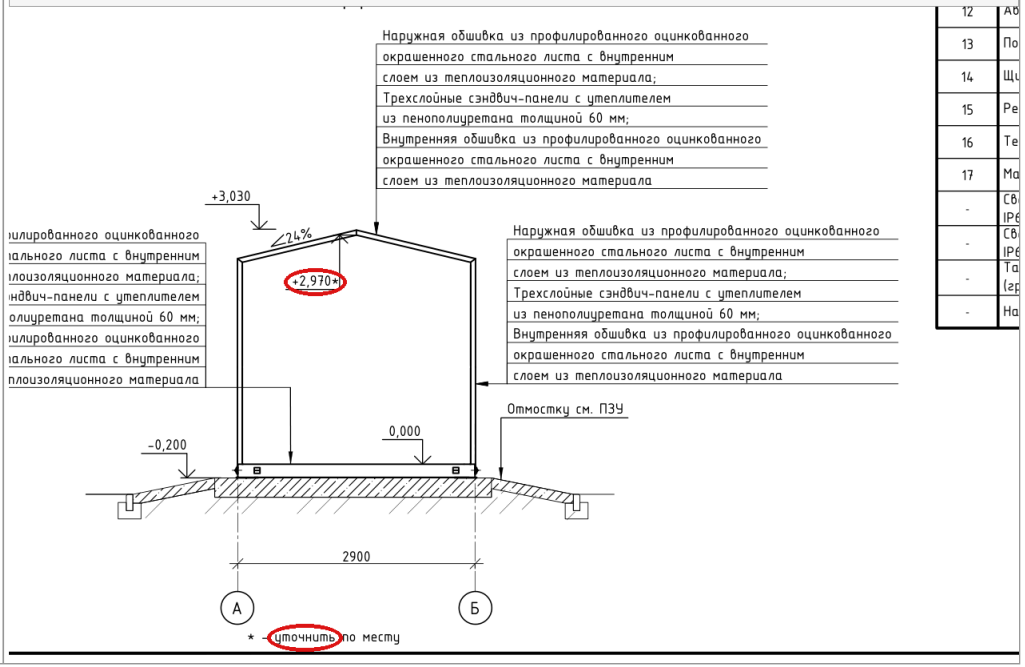


Лист 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.04. Модульная компрессорная: разрез 1-1

Редакция от 29.07.2026:
Раздел ПД №4 Подраздел №1 Часть №2 ИЛО1.2 (Парк_АР)(1439_2025_4) 26.07.29.pdf
лист 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.06 (стр. 33)

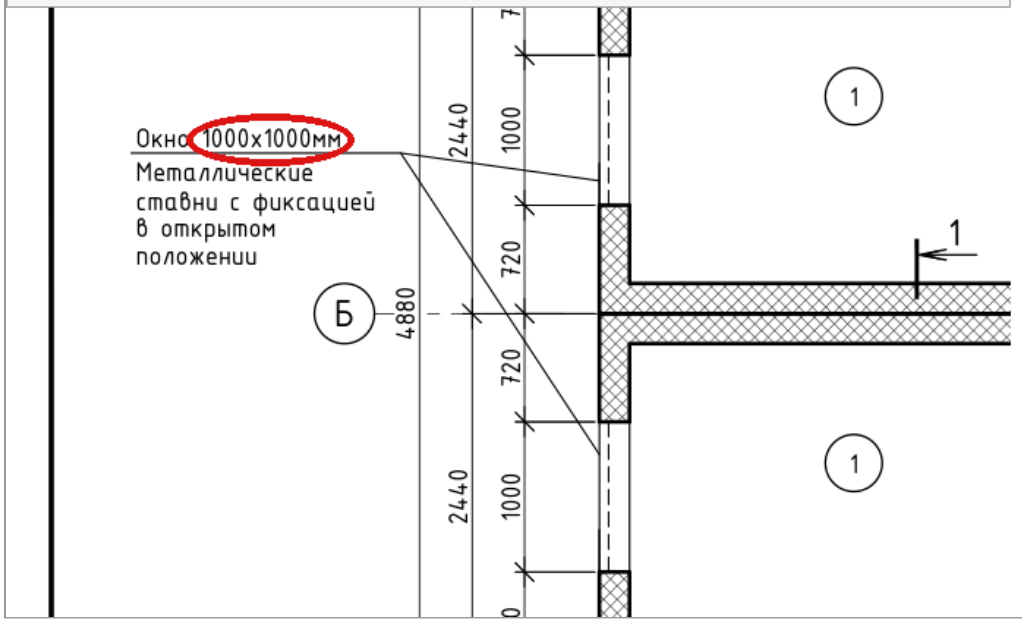


Редакция от 16.10.2026:
Раздел ПД №4 Подраздел №1 Часть №2 ИЛО1.2 (Парк_АР)(1439_2025_4) 26.10.16.pdf
лист 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.06 (стр. 33)

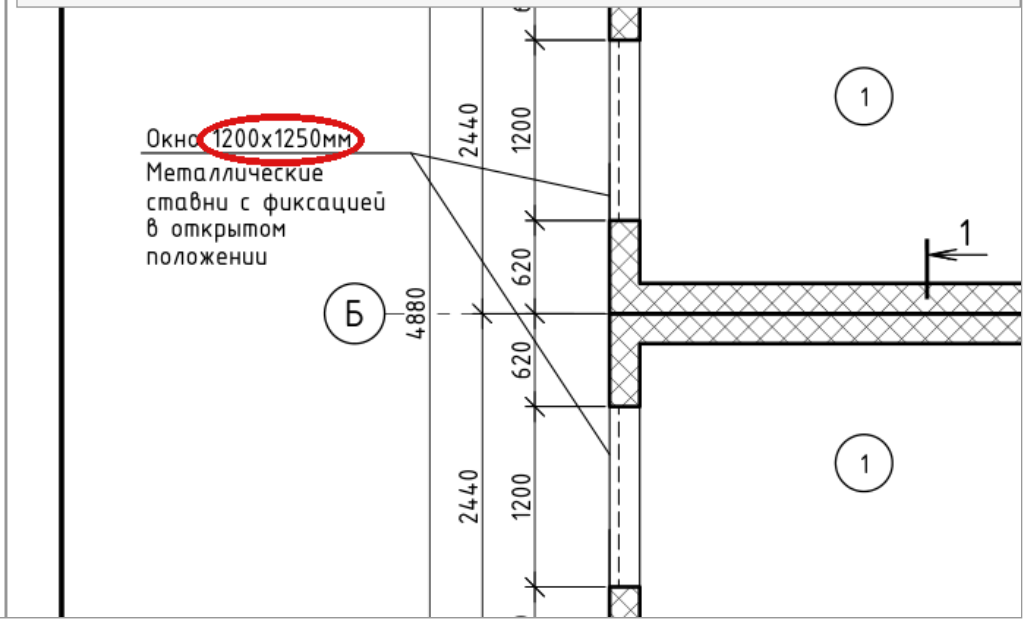

Лист 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.06. Модульный пункт обогрева: окно на плане


Редакция от 29.07.2026: Раздел ПД №4 Подраздел №1 Часть №2 ИЛО1.2 (Парк_АР)(1439_2025_4) 26.07.29.pdf
лист 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.07 (стр. 34)

Редакция от 16.10.2026: Раздел ПД №4 Подраздел №1 Часть №2 ИЛО1.2 (Парк_АР)(1439_2025_4) 26.10.16.pdf
лист 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.07 (стр. 34)

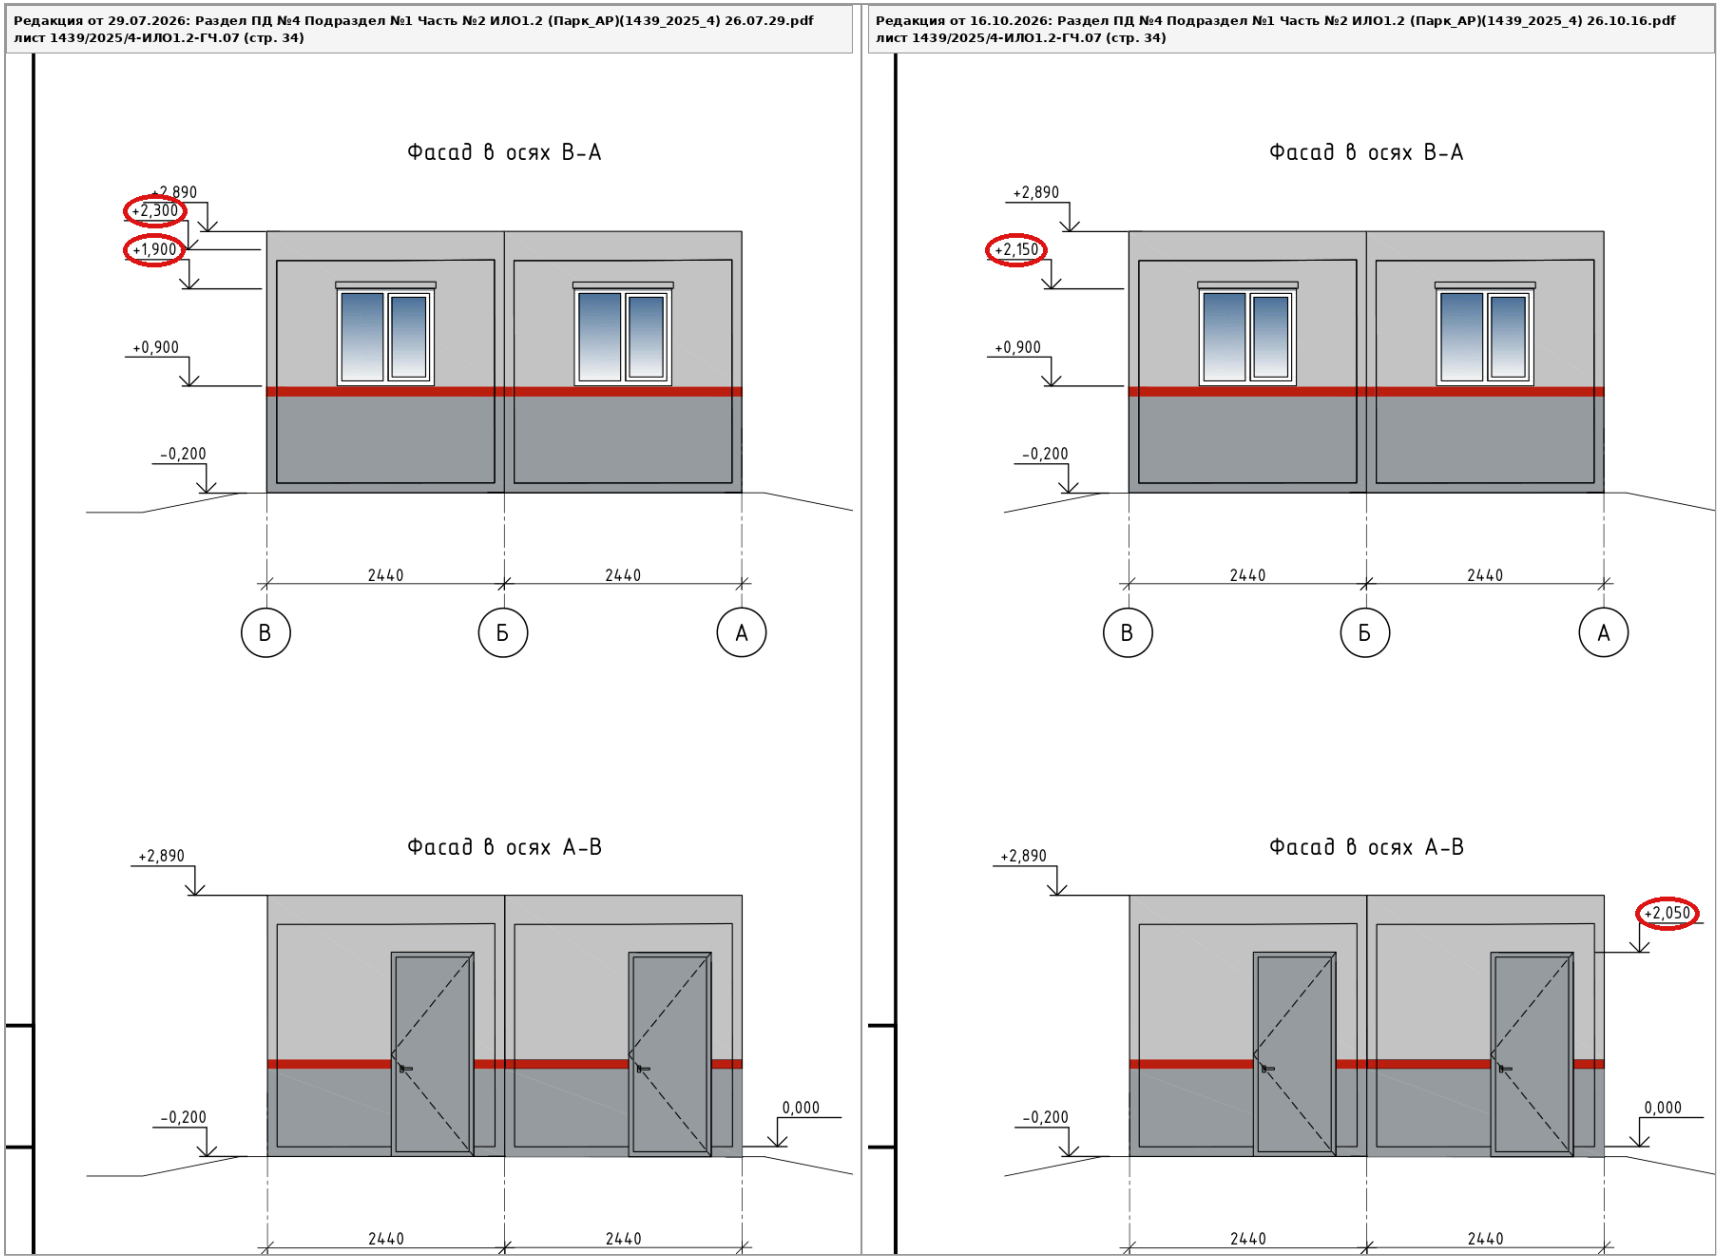


Лист 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.07. Модульный пункт обогрева: фасады В-А и А-В

Редакция от 29.07.2026: Раздел ПД №4 Подраздел №1 Часть №2 ИЛО1.2 (Парк_АР)(1439_2025_4) 26.07.29.pdf
лист 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.08 (стр. 35)

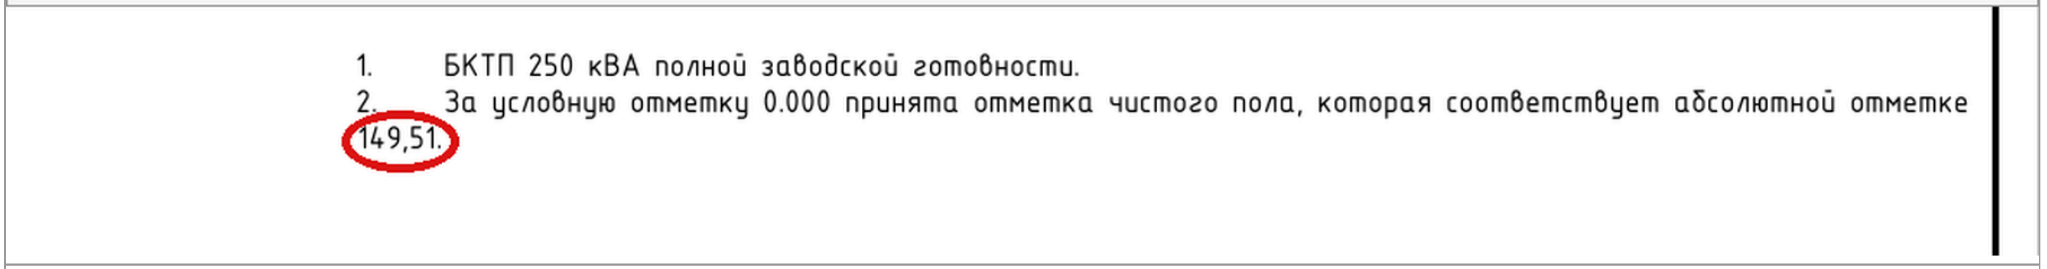

1. БКТП 250 кВА полной заводской готовности.
2. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола, которая соответствует абсолютной отметке 149,51.

Редакция от 16.10.2026: Раздел ПД №4 Подраздел №1 Часть №2 ИЛО1.2 (Парк_АР)(1439_2025_4) 26.10.16.pdf
лист 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.08 (стр. 35)

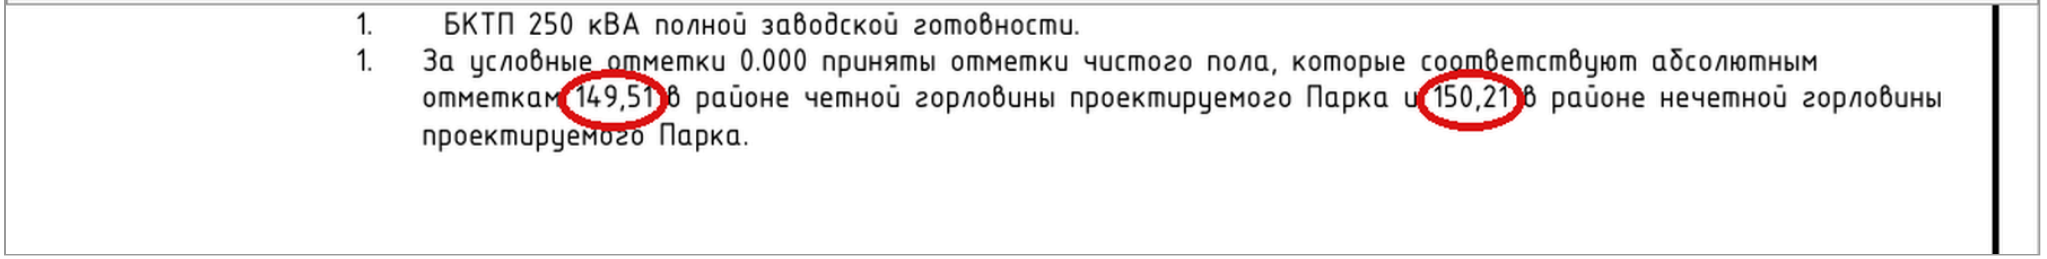


1. БКТП 250 кВА полной заводской готовности.
1. За условные отметки 0.000 приняты отметки чистого пола, которые соответствуют абсолютным отметкам 149,51 в районе четной горловины проектируемого Парка и 150,21 в районе нечетной горловины проектируемого Парка.

Лист 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.08. БКТП 250 кВА: примечания

Экспликация помещений бытового модуля, лист 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.09

№	Редакция от 29.07.2026	м²	№	Редакция от 16.10.2026	м²
1	Комната приема пищи	12,17	1	Комната приема пищи	12,17
2	с/у	4,72	2	Тамбур с раковиной и местом для уборочного инвентаря	3,60
3	с/у	2,16	2а	Уборная	0,95
4	Гардеробная мужская	9,54	3	Тамбур с раковиной	1,10
5	Гардеробная мужская	19,88	3а	Уборная при гардеробной	0,95
6	Душевая	5,32	4-5	Гардеробная мужская на 6 чел. (2г)	35,16
7	Помещение сушки спецодежды	4,36	6	Душевая	5,32
8	Гардеробная женская	9,69	7	Помещение сушки спецодежды	4,36
9	Душевая	2,00	8	Гардеробная женская на 2 чел. (2г)	9,69

10	с/у	3,13	9	Душевая	2,00
11	Коридор	32,64	10	с/у	3,13
12	Кабинет приемосдатчиков	10,91	11	Коридор	32,64
13	Кабинет Мастера ПТО, ОРВ	16,00	12	Кабинет приемосдатчиков 2 чел	10,91
14	Электрощитовая	3,88	13	Кабинет мастера и оператора ПТО (2 чел)	16,20
15	Серверная	4,20	14	Электрощитовая	3,63
16	Водомерный узел	4,88	15	Серверная	4,20
			16	Водомерный узел	4,88
	Сумма площадей помещений	**145,48**		**Сумма площадей помещений**	**150,89**
	Общая площадь по показателям	145,48		Общая площадь по показателям	145,48

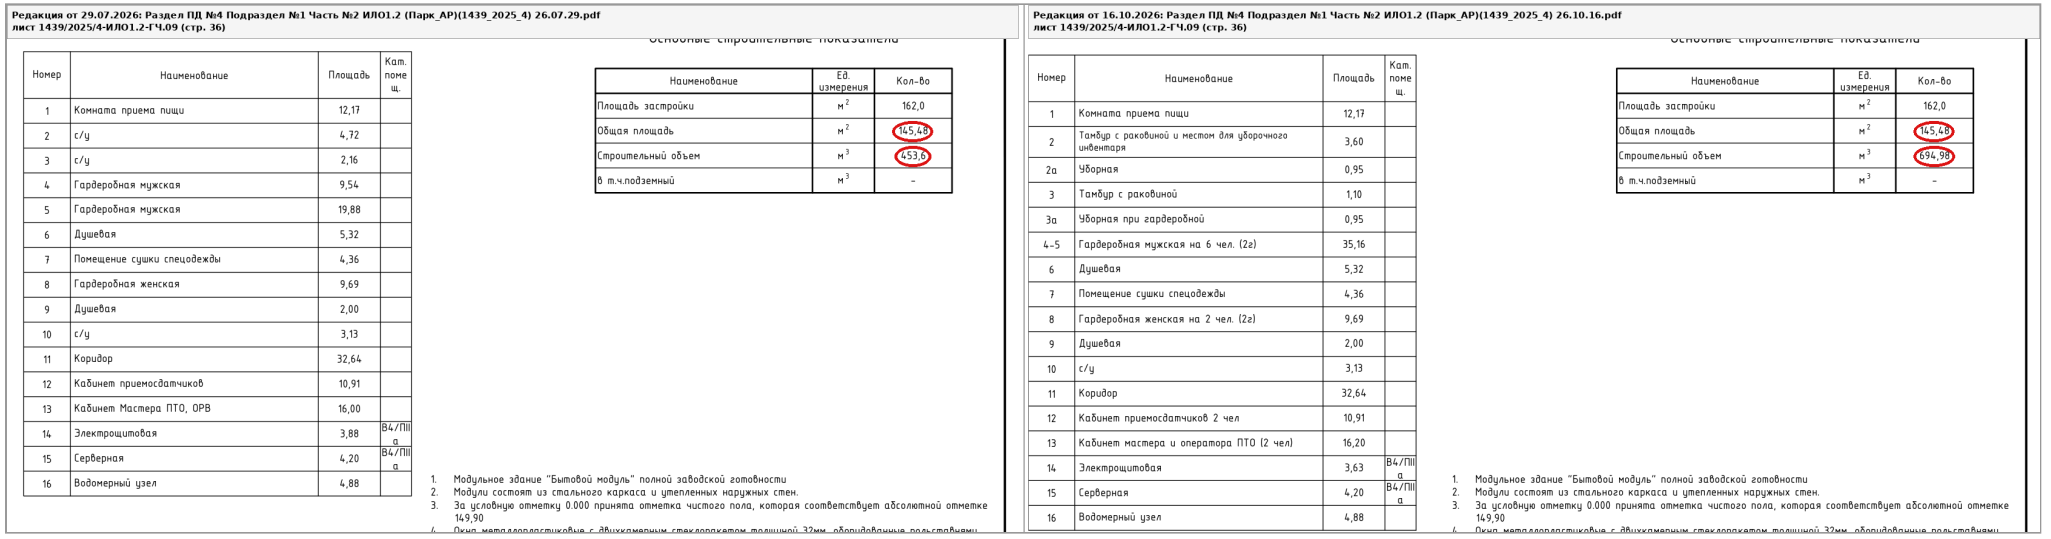

Редакция от 29.07.2026: Раздел ПД №4 Подраздел №1 Часть №2 ИЛО1.2 (Парк_АР)(1439_2025_4) 26.07.29.pdf
лист 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.09 (стр. 36)

Номер	Наименование	Площадь	Кат. помещ.
1	Комната приема пищи	12,17	
2	с/у	4,72	
3	с/у	2,16	
4	Гардеробная мужская	9,54	
5	Гардеробная мужская	19,88	
6	Душевая	5,32	
7	Помещение сушки спецодежды	4,36	
8	Гардеробная женская	9,69	
9	Душевая	2,00	
10	с/у	3,13	
11	Коридор	32,64	
12	Кабинет приемосдатчиков	10,91	
13	Кабинет Мастера ПТО, ОРВ	16,00	
14	Электрощитовая	3,88	В4/ПIIIа
15	Серверная	4,20	В4/ПIIIа
16	Водомерный узел	4,88	

Основные строительные показатели

Наименование	Ед. измерения	Кол-во
Площадь застройки	м^2	162,0
Общая площадь	м^2	145,48
Строительный объем	м^3	453,6
в т.ч.подземный	м^3	–

1. Модульное здание "Бытовой модуль" полной заводской готовности
2. Модули состоят из стального каркаса и утепленных наружных стен.
3. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола, которая соответствует абсолютной отметке 149,90
4. Окна металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32мм, оборудованные подоконниками

Редакция от 16.10.2026: Раздел ПД №4 Подраздел №1 Часть №2 ИЛО1.2 (Парк_АР)(1439_2025_4) 26.10.16.pdf
лист 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.09 (стр. 36)


Номер	Наименование	Площадь	Кат. помещ.
1	Комната приема пищи	12,17	
2	Тамбур с раковиной и местом для уборочного инвентаря	3,60	
2а	Уборная	0,95	
3	Тамбур с раковиной	1,10	
3а	Уборная при гардеробной	0,95	
4-5	Гардеробная мужская на 6 чел. (2г)	35,16	
6	Душевая	5,32	
7	Помещение сушки спецодежды	4,36	
8	Гардеробная женская на 2 чел. (2г)	9,69	
9	Душевая	2,00	
10	с/у	3,13	
11	Коридор	32,64	
12	Кабинет приемосдатчиков 2 чел	10,91	
13	Кабинет мастера и оператора ПТО (2 чел)	16,20	
14	Электрощитовая	3,63	В4/ПIIIа
15	Серверная	4,20	В4/ПIIIа
16	Водомерный узел	4,88	

Основные строительные показатели


Наименование	Ед. измерения	Кол-во
Площадь застройки	м^2	162,0
Общая площадь	м^2	145,48
Строительный объем	м^3	694,98
в т.ч.подземный	м^3	–

1. Модульное здание "Бытовой модуль" полной заводской готовности
2. Модули состоят из стального каркаса и утепленных наружных стен.
3. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола, которая соответствует абсолютной отметке 149,90
4. Окна металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32мм, оборудованные подоконниками


Лист 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.09. Бытовой модуль: экспликация и основные строительные показатели

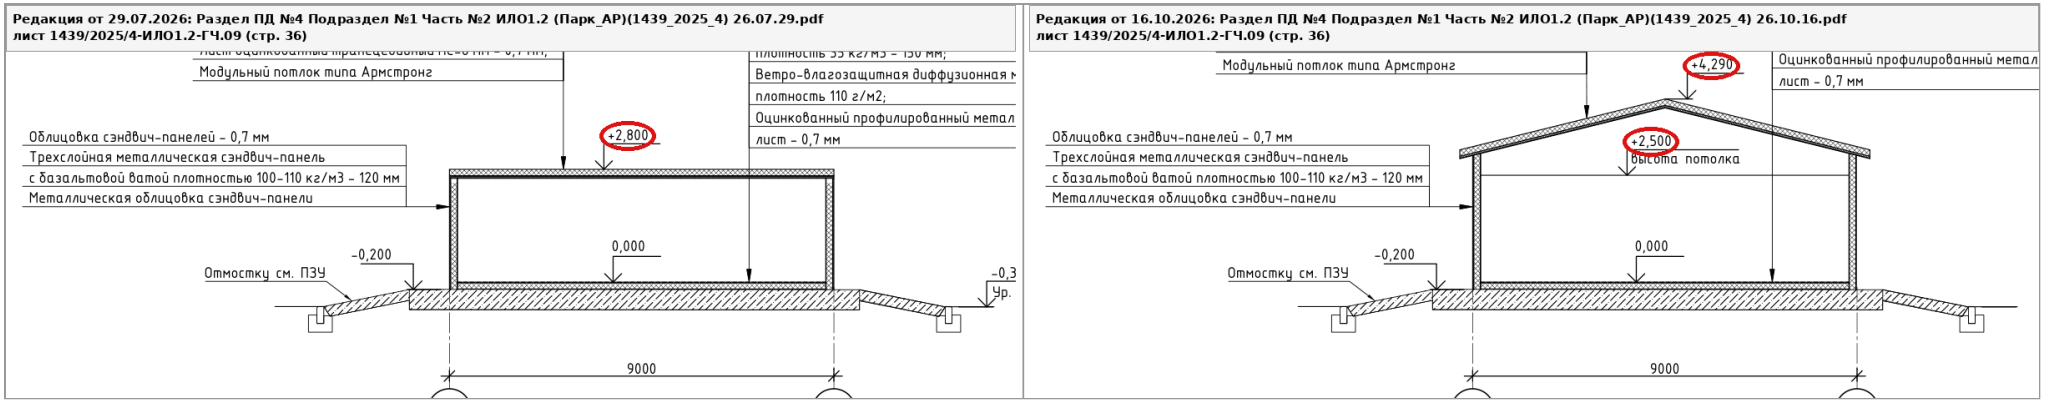

Лист 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.09. Бытовой модуль: разрез 1-1

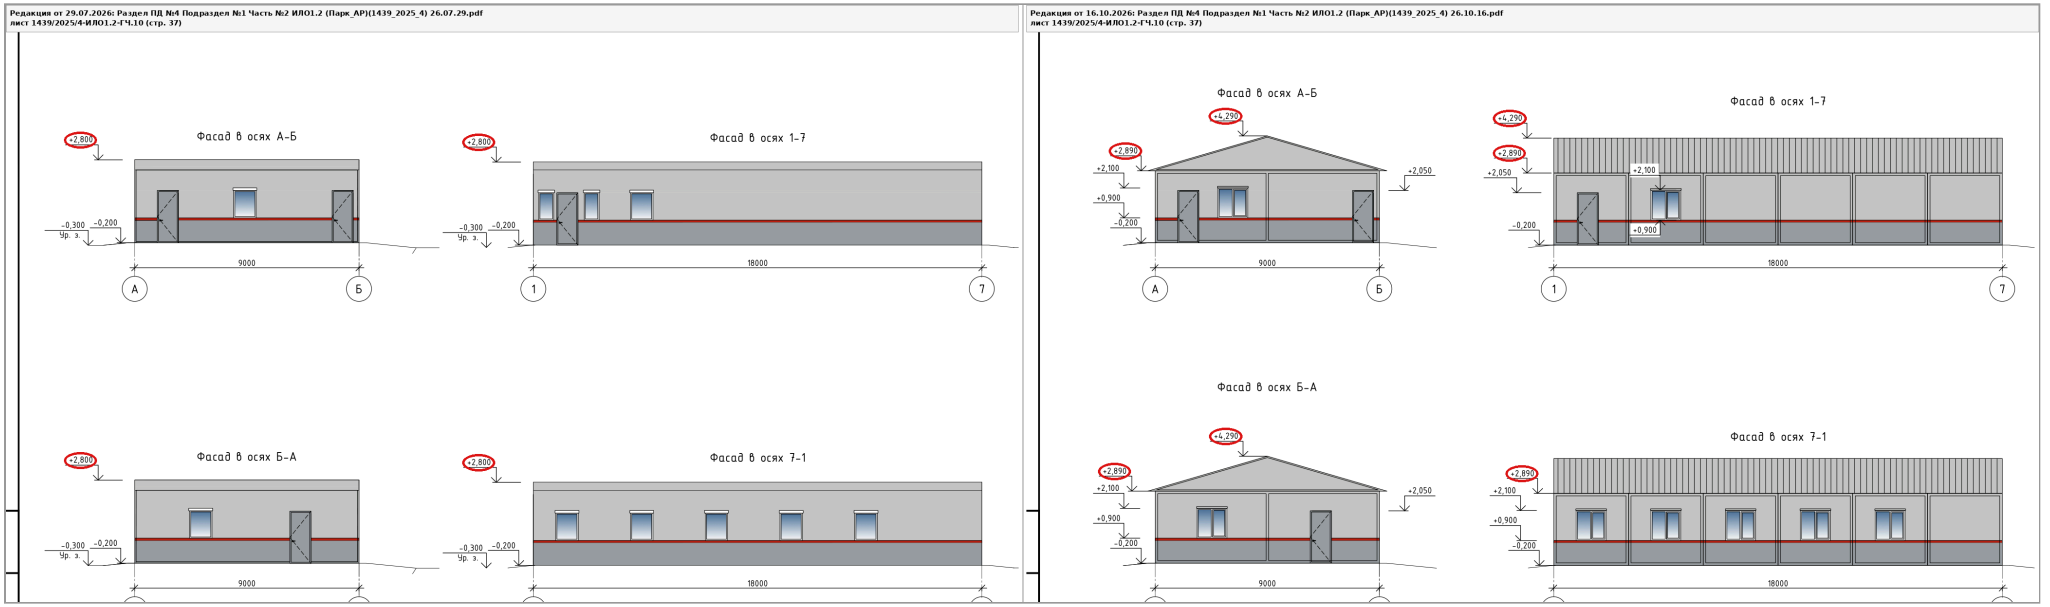

Лист 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.10. Бытовой модуль: фасады

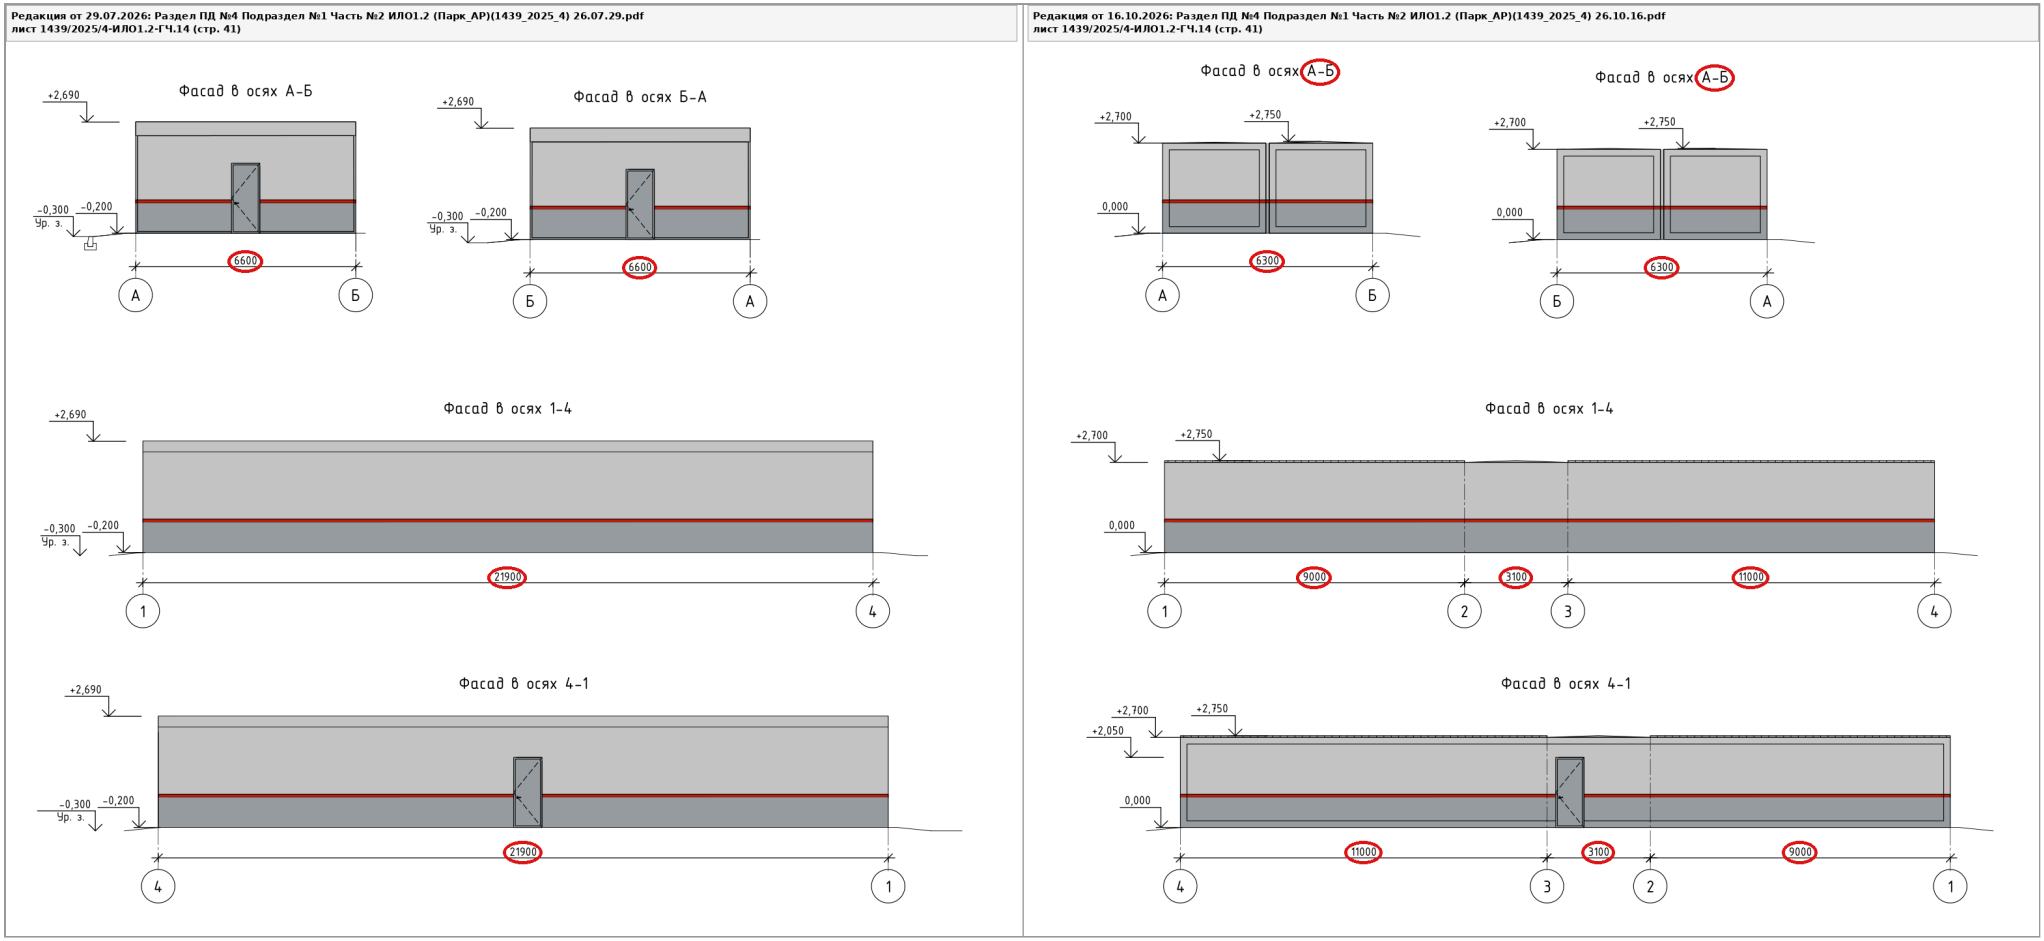

Лист 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.14. Здание МК АТС: фасады

4. Замечания к редакции от 16.10.2026

По изменённым разделам и листам выявлены несоответствия. Прошу проектировщика дать пояснения или внести исправления.

№	Документ, лист	Замечание
1	1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.09	Сумма площадей помещений по экспликации 150,89 м², общая площадь в основных строительных показателях 145,48 м² (в редакции от 29.07.2026 сумма совпадала с показателями — 145,48 м²)

2	1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.09	На плане нет номера помещения 7 (в экспликации есть поз. 7 «Помещение сушки спецодежды», 4,36 м²); помещения 4 и 5 на плане пронумерованы раздельно, в экспликации — одной строкой «4-5»
3	1439/2025/4-ИЛО1.2-ТЧ, раздел 15 / 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.09	В текстовой части: «Место для хранения уборочного инвентаря предусмотрено в помещении санузла, пом. №2». На листе 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.09 пом. 2 — «Тамбур с раковиной и местом для уборочного инвентаря», уборная — пом. 2а
4	1439/2025/4-ИЛО1.2-ТЧ, подраздел 14.4 / 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.09	В текстовой части основное помещение — «кабинет мастера ПТО, ОРВ», на листе — «Кабинет мастера и оператора ПТО (2 чел)»
5	1439/2025/4-ИЛО1.2-ТЧ, раздел 9	Сохранён текст «Полы в «Туалетном модуле» выполнены из алюминиевого листа рифленого (тип рифления квинтет) толщиной 1,5 мм» и добавлен текст «Напольное покрытие помещений туалетного модуля предусмотрено линолеумом Tarkett ACCZENT PRO, или аналогом». На листе 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.02 в составе пола указан «Алюминиевый лист рифленый 1,5 мм»
6	1439/2025/4-ИЛО1.2-ТЧ, подраздел 5.2 / 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.06	Модульный пункт обогрева: в тексте подраздела 5.2 «Базальтовая вата толщиной 120 мм», в таблице того же подраздела «Стена Базальт. вата 150», на разрезе листа 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.06 «Панель стеновая трехслойная с базальтовой ватой… – 150 мм»
7	1439/2025/4-ИЛО1.2-ТЧ, подразделы 5.2, 5.3 и раздел 10 / 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.09, 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.10	Тип стеклопакета бытового модуля и пункта обогрева: подразделы 5.2 и 5.3 — «с однокамерными стеклопакетами»; раздел 10 — «окна из ПВХ-профиля с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674—2023» и далее «Заполнение: стеклопакет однокамерный, энергоэффективный, тонированный СПО (32 мм)»; примечания листов 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.09 и 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.10 — «Окна металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32мм»
8	1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.02	На плане размер между осями А–Б 2000 мм, на разрезе 1-1 между теми же осями — 1700 мм
9	1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.04	Отметка «+2,970*» со сноской «* - уточнить по месту» — в проектной документации отметка должна быть определена
10	1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.08	Два примечания под номером «1.»
11	1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.14	Два фасада с названием «Фасад в осях А-Б»; у второго оси подписаны в порядке Б…А (в редакции от 29.07.2026 — «Фасад в осях Б-А»)
12	1439/2025/4-ИЛО1.2-С (стр. 4) Содержание тома	Содержание тома в обеих редакциях одинаковое: «Текстовая часть» (с. 4), «Графическая часть» (с. 27). Технические паспорта, включённые в редакцию от 16.10.2026 (стр. 42–101), в содержании тома не указаны

5. Габариты зданий и окон в текстовой и графической частях редакции от 16.10.2026 совпадают

Объект	Текстовая часть 1439/2025/4-ИЛО1.2-ТЧ	Графическая часть
Туалетный модуль	п. 3.2: 2 000×1 500×2 650	1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.02: план 1500×2000, разрез 2650; 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.03: ширина 1500 / 2000, верх +2,650
Бытовой модуль	п. 3.4: 18,0x9,0x4,29 (h) м	1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.09, 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.10: 18000×9000, верх +4,290
Здание МК АТС	п. 3.7: 6,3×23,1×2,75 (h) м	1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.14: 6300; 9000+3100+11000 = 23100; верх +2,750
Окно пункта обогрева	п. 10: 1200×1250	1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.06: «Окно 1200x1250мм», проём 1200; 1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.07: +2,150 − 0,900 = 1,250
Окно туалетного модуля	п. 10: 600×600	1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.03: +1,950 − 1,350 = 0,600 (ширина окна на листе не проставлена)
Окно бытового модуля	п. 10: 1200×1200	1439/2025/4-ИЛО1.2-ГЧ.10: +2,100 − 0,900 = 1,200 (ширина окна на листе не проставлена)

Составил: ведущий инженер _____ / _____ /

Дата: _____
